


Strassenplan	
Strassen-Nr.	228
Strassenart	Münstingen - Konolfingen - Zäziwil
Gemeinde	Konolfingen
Projekt vom	16. April 2018
Revident	
Projekt-Nr.	220.20074
Plan-Nr.	5355.x
Format	147 x 60 cm

Bauphasenplan 1:200

Neubau Kreisell Konolfingen

Projektleitung	FLM Bauingenieur und Planer AG	CEO Ingenieur AG
Geobau Ingenieure AG	Bärenplatz 3, Postfach 803	Hessstrasse 27d
3110 Münsingen	3076 Wetz	3087 Lebern
Tel. 031 724 30 30	Tel. 031 638 78 78	Tel. 031 919 30 62
info@geobau.ch	info@fm-ing.ch	info@cead.ch

Plan genehmigt

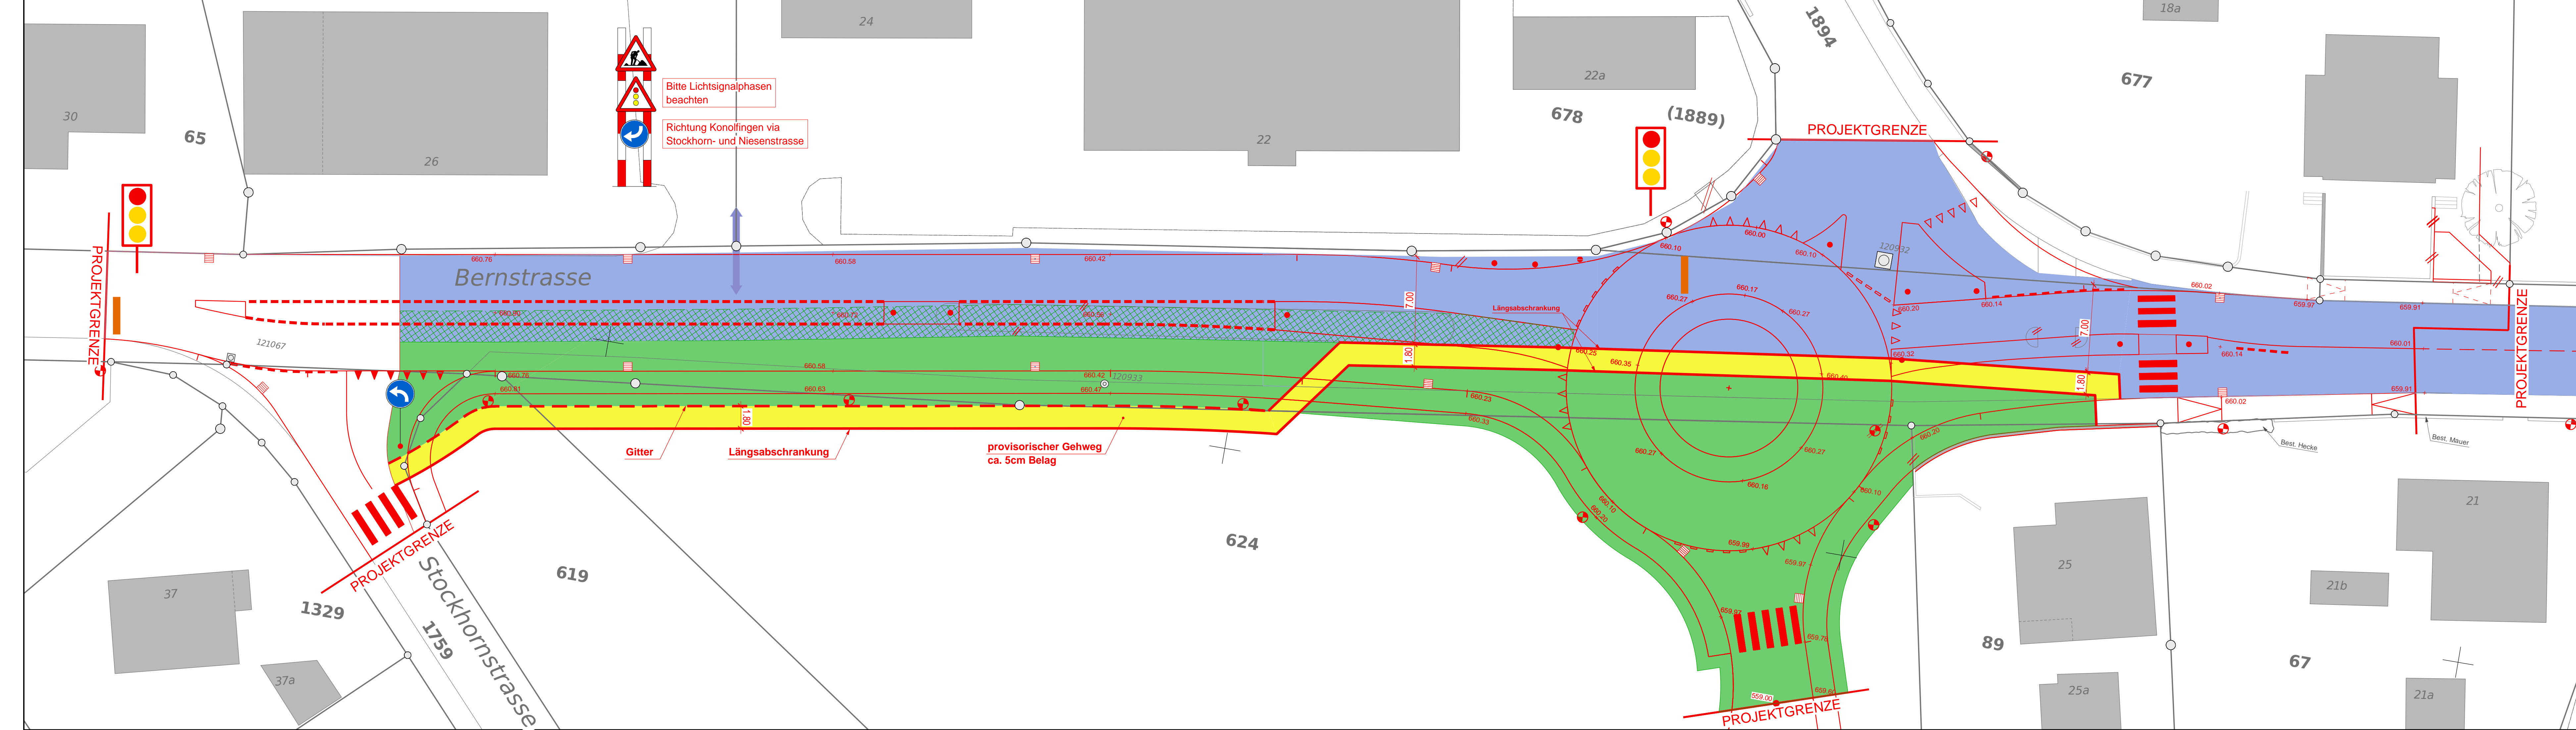

LEGENDE

- Arbeitsperimeter
- Fussgänger
- Verkehrsflächen
- Quartierserschliessungen
- Hauszufahrten/-zugänge

Phase 1 A vom Mo. 19. März - Mo. 23. April

Verkehrsführung:

- 2-spurig auf best. Fahrbahn, mind. 6.50 m
- Fussgängerweg auf best. Fahrbahn und über die Baustelle, mind. 1.80 m (beidseitige Abschränkung)
- Hauszugänge z.T. über die Baustelle

Arbeitsbeschreibung:

- Erstellen 1/2 des neuen Kreisells und neue Zugangsstrasse
- Erstellen neue Werkleitungen und Strassenentwässerung
- Erstellen Trottoir

- Strassenquerung WAKI vom Mo. 16. April - Fr. 20. April
 Regelung mit Verkehrsdienst (zwei Mann), Verkehrsbehinderung im Haldenweg

Phase 1 B vom Mo. 23. April - Mi. 2. Mai


Verkehrsführung:

- 1-spurig auf best. Fahrbahn, mind. 3.50 m - Ampelbetrieb
- Fussgängerweg auf best. Fahrbahn und über die Baustelle, mind. 1.80 m (beidseitige Abschränkung)

zu Beginn und erster Samstag gegebenenfalls mit Verkehrsdienst

Arbeitsbeschreibung:

- Erstellen halbe Strassenseite

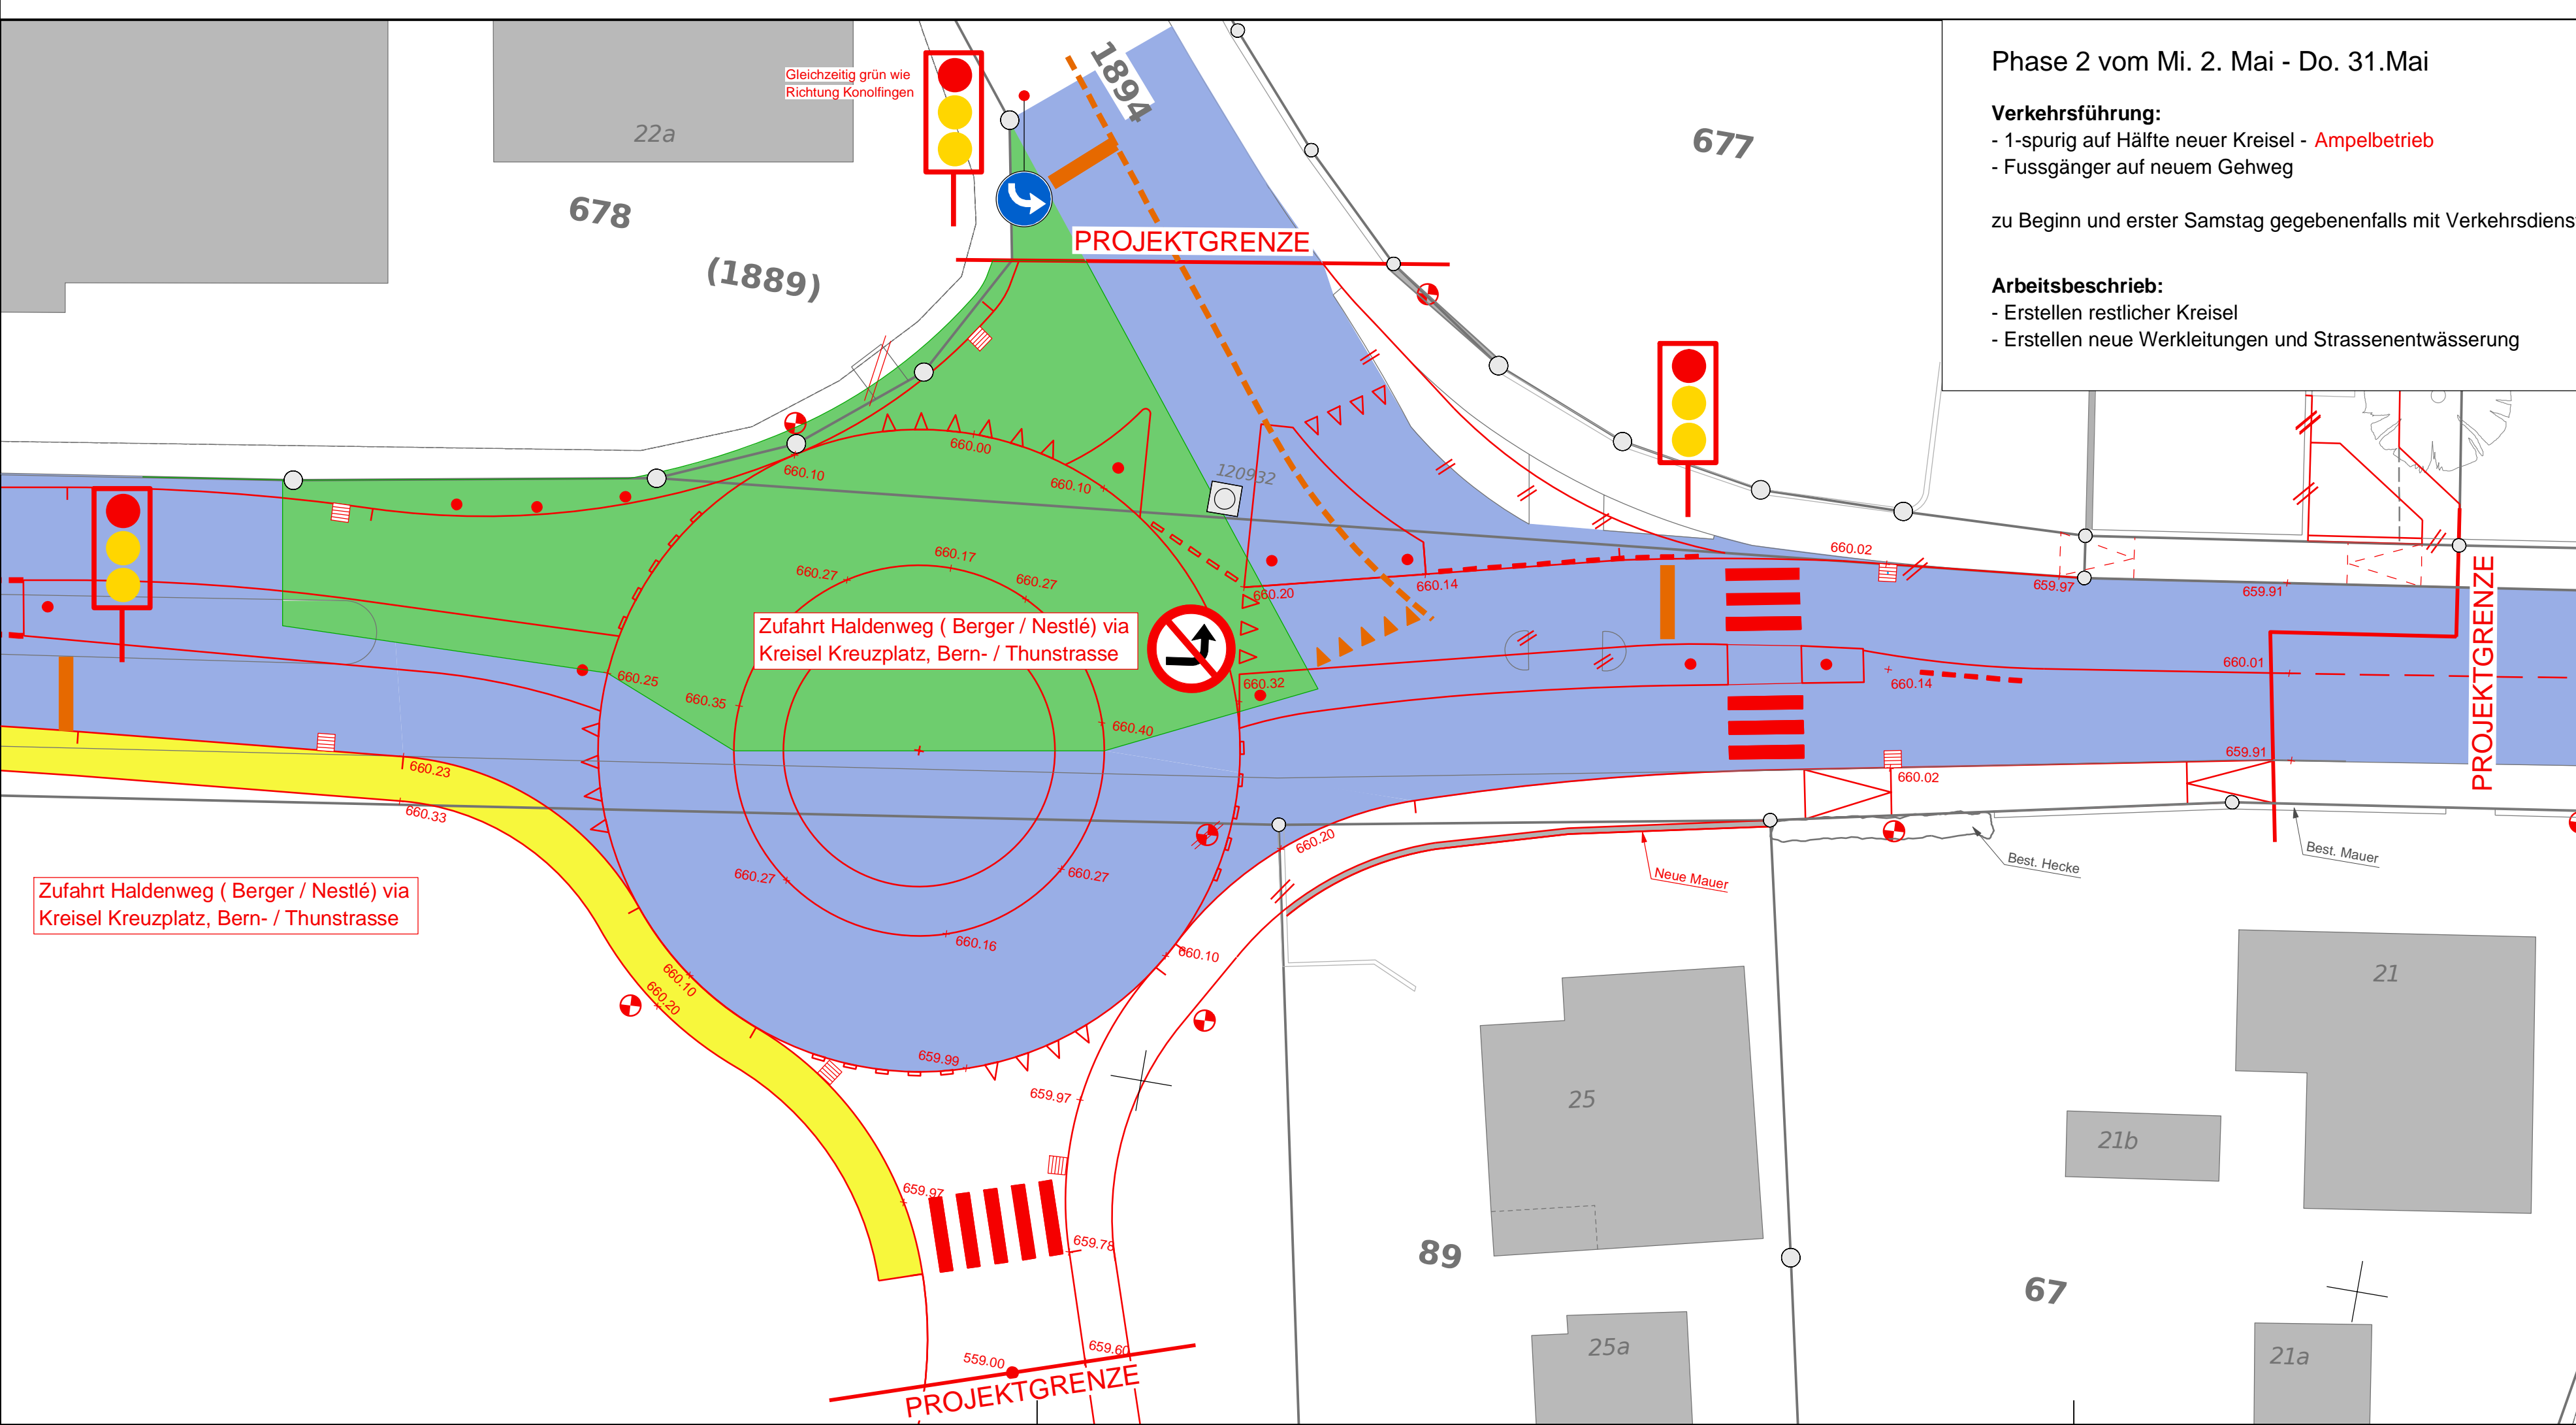

Phase 2 vom Mi. 2. Mai - Do. 31. Mai


Verkehrsführung:

- 1-spurig auf Hälfte neuer Kreisell - Ampelbetrieb
- Fussgänger auf neuem Gehweg

zu Beginn und erster Samstag gegebenenfalls mit Verkehrsdienst

Arbeitsbeschreibung:

- Erstellen restlicher Kreisell
- Erstellen neue Werkleitungen und Strassenentwässerung

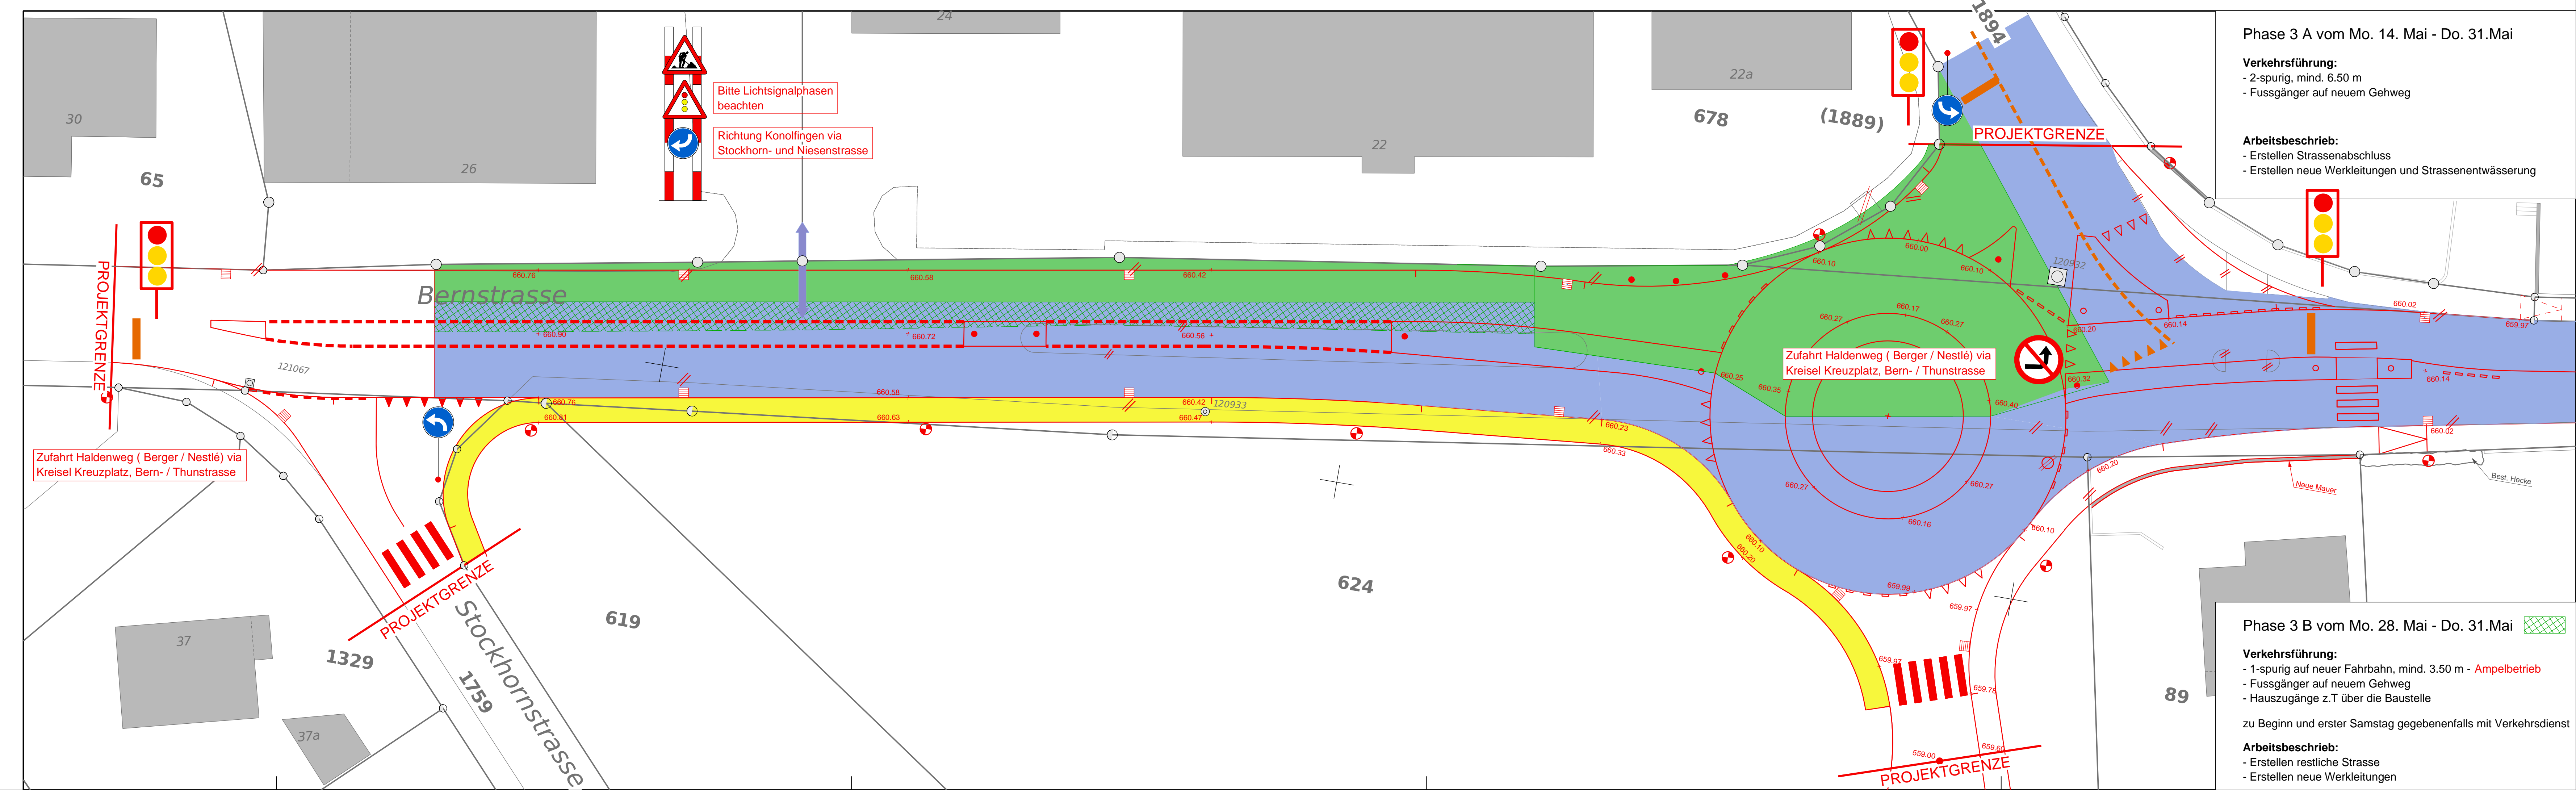

Phase 3 A vom Mo. 14. Mai - Do. 31. Mai

Verkehrsführung:

- 2-spurig, mind. 6.50 m
- Fussgänger auf neuem Gehweg

Arbeitsbeschreibung:

- Erstellen Strassenabschluss
- Erstellen neue Werkleitungen und Strassenentwässerung

Phase 3 B vom Mo. 28. Mai - Do. 31. Mai

Verkehrsführung:

- 1-spurig auf neuer Fahrbahn, mind. 3.50 m - Ampelbetrieb
- Fussgänger auf neuem Gehweg
- Hauszugänge z.T. über die Baustelle

zu Beginn und erster Samstag gegebenenfalls mit Verkehrsdienst

Arbeitsbeschreibung:

- Erstellen restliche Strasse
- Erstellen neue Werkleitungen
